OBČINA TABOR
Tabor 21, 3304 Tabor
Tel.: 03 705 70 80, e-pošta: info@obcina-tabor.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

(vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)

PO POTI DO RAČNIKA IN ŽIVIH VODA: VAROVANJE BREZZOBKE, ŽAB IN MIRNIH ZATOČIŠČ RACE MLAKARICE



Datum izdelave dokumenta:
Tabor, junij 2026

VSEBINA

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 4

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 5

2.1. SPLOŠNI OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA 5
2.2. OBSTOJEČE STANJE 7
2.3. VPLIVNO OBMOČJE PROJEKTA 9
2.4. SPLOŠNI PODATKI O UPORABNIKIH 11
2.5. RAZLOGI IN UTEMELJITEV INVESTICIJSKE NAMERE 12

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 14

3.1. CILJI INVESTICIJE 14
3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI 14

4. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE 17

4.1. VARIANTA BREZ INVESTICIJE 17
4.2. VARIANTA Z INVESTICIJO 17
4.3. PRIMERJAVA VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE 17

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 18

5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 18
5.2. DOLOČITEV POTREBNE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO 18
5.3. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ 18
5.4. DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE 19
5.5. DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 20
5.6. POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR 20

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 21

6.1. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA, IZVEDLJIVOST 21
6.2. TERMINSKI PLAN 21
6.3. VARSTVO OKOLJA IN VPLIVI NA OKOLJE 21
6.4. KADRI IN ORGANIZACIJA 21
6.5. FINANCIRANJE PROJEKTA 22
6.6. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZ. EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA 22

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 24

8. PRILOGE 25

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR IN ODGOVORNE OSEBE	
Naziv	OBČINA Tabor
Naslov	Tabor 21, 3304 Tabor
Odgovorna oseba	Marko Semprimožnik, župan
Telefon	03 705 70 80
E-pošta	info@obcina-tabor.si
Matična številka	1357727000
Davčna številka	ID za DDV: SI43471862
Transakcijski račun	SI56 0138 4010 0004 757

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	
	Saša Zidanšek Obreza, univ. dipl. ekon.
Telefon	03 705 70 88
E-pošta	sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si

Odgovorna oseba za izvedbo investicije	
	Saša Zidanšek Obreza, univ. dipl. ekon.
Telefon	03 705 70 80
E-pošta	sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si

LASTNIŠTVO	
Ime lastnika	Občina Tabor
Naslov	Tabor 21, 3304 Tabor

BODOČI UPRAVLJAVEC	
Naziv	OBČINA Tabor
Naslov	Tabor 21, 3304 Tabor
Odgovorna oseba	Marko Semprimožnik, župan
Telefon	03 705 70 80
E-pošta	info@obcina-tabor.si

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. SPLOŠNI OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA

Predmet projekta je: ureditev dostopa do Račnika, kjer se nahajajo školjke brezzobke - potočni škržki, zatočišča divjih rac, naravni prehod za žabe pod dovozno cesto, postavitev informativnih tabel s QR kodami, izvedba naravovarstvenih delavnic in strokovnega predavanja,

Izvedba projekta zajema:

I. **Preddela:**
- Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase krajevne ceste v gričevnatem terenu,
- Zakoličba obstoječih komunalnih vodov,
- Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu,
- Obrezovanje grmičevja z drevesi, nalaganje obrezlin in odvoz na deponijo,
- Odstranitev dreves z debli z ruvanjem panjev,
- Čiščenje obstoječega prepusta,
- Rezanje asfaltne plasti z rušenjem obstoječega asfalta,
- Zavarovanje gradbišče v času gradnje z delno zaporo prometa.

II. **Zemeljska dela:**
- Izkop zemljine/zrnate kamnine (cesta s priključki, razširitve, sanacija temeljnih tal, ponižanje pri navezavah, za temeljenje, kanalske rove, prepuste, drenaže, odvoz na lokalno deponijo, izkop za odkrivanje obstoječih komunalnih vodov)
- Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine,
- Izvedba zasipa z zrnato kamnine – strojno z izkopanim materialom,
- Dobava in vgrajevanje nasipa,
- Nalaganje odvečnega zemeljskega materiala in odvoz na deponijo,
- Humuniziranje, zatravitev
- Čiščenje obstoječih jarkov in odvoz materiala na deponijo.

III. **Voziščne konstrukcije:**
- Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti
- Planum; grederiranje in valjanje zgornjega ustroja,
- Izdelava nosilne in obrabne zaporne plasti bituminizirane zmesi: cesta z muldo in priključki, izdelava bankin.

IV. **Odvodnjavanje:**
- Dobava materiala in izdelava drenaže,
- Čiščenje obstoječih prepustov.

V. **Ostala dela:**
- Meritve nosilnosti zgornjega ustroja,
- Projektantski nadzor
- Čiščenje gradbišča po končanju del.

VI. **Postavitev informativnih tabel s QR kodami:**
- brezzobka,
- raca mlakarica,
- žabe.

VII. **Izvedba naravovarstvenih delavnic**

VIII. **Izvedba strokovnega predavanja**

Namen projekta

Izboljšala se bo dostopnost in trajnostna ureditev območja ob Račniku ter se hkrati okrepilo varstvo naravne dediščine in biotske raznovrstnosti na območju občine. Projekt združuje infrastrukturne, naravovarstvene in izobraževalne aktivnosti, s katerimi se vzpostavlja kakovostnejše in varnejše okolje za prebivalce ter obiskovalce, ob sočasnem ohranjanju habitatov ogroženih in varovanih živalskih vrst.

V okviru projekta bo izvedena ureditev in asfaltiranje poti do Račnika, skozi katerega teče potok, s čimer se bo izboljšala dostopnost območja ter zmanjšali negativni vplivi nenadzorovanega gibanja obiskovalcev na občutljivem naravnem habitatu. Urejena infrastruktura bo omogočala usmerjeno in varno uporabo prostora ter prispevala k zmanjšanju erozije, prašenja in drugih obremenitev okolja.

Poseben poudarek projekta je namenjen varovanju in izboljšanju življenjskih pogojev za školjko brezzobko iz družine potočnih škržkov, žabe in za populacije rac mlakaric, ki na območju gnezdijo. Projekt bo dodatno podprl ozaveščanje javnosti o pomenu vodnih in obvodnih ekosistemov ter ohranjanja ogroženih vrst.

Pomemben del projekta predstavljajo tudi informacijske in izobraževalne aktivnosti. Postavljene bodo interpretacijske table z vsebinami o školjki brezzobki, divjih racah ter pomenu ohranjanja naravnih habitatov, izvedene pa bodo tudi naravovarstvene delavnice in strokovno predavanje za lokalno prebivalstvo, otroke in druge ciljne skupine. Na ta način bo projekt prispeval k dvigu okoljske ozaveščenosti, krepitvi odnosa do narave ter spodbujanju trajnostnega sobivanja človeka z naravnim okoljem.

Projekt sledi ciljem trajnostnega razvoja podeželja, ohranjanja narave, izboljšanja kakovosti bivanja ter razvoja zelene infrastrukture, obenem pa krepi lokalno identiteto in privlačnost območja za rekreacijo, učenje in doživljanje narave.

Investicija predstavlja dolgoročno uporabo naložbe

Urejena infrastruktura trajno izboljšala dostopnost in urejenost območja ob Račniku ter omogočala varno uporabo prostora za rekreacijo, izobraževanje in doživljanje narave tudi v prihodnjih desetletjih. Asfaltirana pot bo zmanjšala stroške rednega vzdrževanja in omejila negativne vplive na okolje, ki nastajajo zaradi neurejenih površin in nenadzorovanega gibanja obiskovalcev.

Postavljena naravovarstvena infrastruktura, kot so inovativna gnezdišča za divje race in informacijske table, bo dolgoročno služila ohranjanju habitatov ter ozaveščanju obiskovalcev o pomenu varstva narave in vodnih ekosistemov. Izvedene aktivnosti bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju območja in izboljšanju pogojev za zaščitene ter avtohtone vrste, predvsem potočnega škržka in vodnih ptic.

Naložba bo imela trajne učinke tudi na lokalno skupnost, saj bo območje primerno za izvajanje naravovarstvenih delavnic, učnih poti in drugih izobraževalnih vsebin, ki bodo spodbujale razvoj okoljske zavesti in trajnostnega turizma. Projekt tako ustvarja dolgoročne družbene, okoljske in razvojne koristi ter zagotavlja večnamensko uporabo prostora za različne generacije uporabnikov.

2.2. OBSTOJEČE STANJE


Račnik, ki je nekakšno malo jezerce se nahaja v župnijskem gozdu in je nastal leta 1977, ko je skupina članov Lovske družine Tabor dobila idejo, da bi obnovila zapuščen župnijski ribnik s soglasjem lastnika zemljišča. Namen je bil, da bi zgradili umetno vodno telo in privabili ter trajno naselili vodno pernato divjad. Naravne danosti zajezenega območja so omogočile obnovitev umetne pregrade in tako je nastal ribnik, ki so mu zaradi njegovega prvotnega namena nadeli ime Račnik. Zemeljska pregrada je zadržala vodo in kmalu zalila skoraj 2.000 kvadratnih metrov površine. Na gladini so postavili gnezdilnice in v njih so račke veselo valile svoj podmladek. Ker je lov na pernato divjad skozi leta zaradi spremembe krajine izgubil svoj pomen, je tudi Račniku počasi začela bledeti njegova podoba. Od zajezitve potoka Žerovnik je minilo 48 let in področje je precej spremenilo svojo podobo. Velike količine naplavin so precej dvignile dno ribnika, posledično so se razbohotile vodne rastline in skrile pogled na ribnik. V tem trstičju so našle dom mnoge živali, ki pa so človeškim očem skrite. Severni del ribnika je ohranil globino in tukaj se nahaja zanimiva in redka živalska vrsta. To je sladkovodna školjka brezzobka ali potočni škržek. V zadnji letih je na tem področju nastala skorajda neprehodna goščava z naplavinami.

Obstoječa pot, ki vodi do Račnika je kategorizirana javna pot št. JP 992801 Prekopa-Podlog-Tabor, ki poteka po parcelah št. 1059/2, 1058/2, 1060/4, 1057/2, 1055/2, 1657/2, 1056/7, 1055/3, 1533/26, 1533/23, vse k.o. Ojstriška vas. Gre za slabo vzdrževano makadamsko pot, priključeno na asfaltirano cesto, ki poteka mimo občine, le-ta pa se nato priključi na državno cesto Ojstriška vas – Pondor, ob kateri se nahajajo šola, vrtec, dom krajanov in nepokriti športni objekti.



Slika št. 2: Trasa poti



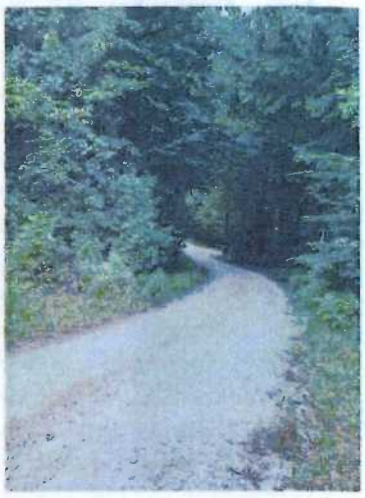

Slike št. 3.1, 3.2, 3.3: Obstoječa makadamska pot

V mesecu septembru 2025 je Lovska družina Tabor voluntersko delno uredila območje Račnika. Odstranjeno je bilo odpadlo vejevje, posekano odvečno grmovje, ki je onemogočalo dostop, prečistile so se naplavine, namestila so se gnezdišča za divje race, obnovila se je lovska opazovalnica in postavile so se klopi. Zaradi obnovitve jezu z umetnim sifonom, se je gladina vode zopet dvignila na prvotno višino. Stezice po obrežju so bile deležne obnove, nasipi in izkopi so zopet dobili svojo funkcijo. Obnovil se je most, ki poteka po delu širine ribnika. Na severnem delu ribnika se nahaja tudi otoček na katerem rastejo drevesa in kamor je speljana obnovljena brv.



Slika 4: Lovska opazovalnica ob Račniku



Slika 5: Most preko Račnika



Slika 6: Gnezdišča divjih rac



Slika 7: Gnezdišča od blizu

2.3. VPLIVNO OBMOČJE PROJEKTA

Občina Tabor je ena izmed 212 in hkrati mlajših občin v Republiki Sloveniji, ki je nastala ob razdružitvi Občine Žalec leta 1999, ko se je nekdanja občina razdelila na šest samostojnih občin. Spada v območje Upravne enote Žalec in v območje Savinjske regije. Površina občine, ki šteje 1.890 prebivalcev (Vir: MNZ, 30.04.2026), meri 34,8 km^2.





Slika št. 8: Zemljevid Slovenije po regijah **Slika št. 9: Zemljevid občin Sp. Savinjske doline**

Občina leži na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline in meji na sosednje občine Vransko, Braslovče, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Občina se deli na dva značilna dela. Ravninski del obsega naselja Kapla, Ojstriška vas, Pondor in Tabor. Tu najdemo bolj strnjena naselja in prvovrstno kmetijsko zemljo, v predlogu prostorskih planov je na tem mestu predvidena tudi gradnja manjše obrtne cone.



Slika št. 10: Naselja Občine Tabor


Hriboviti del občine sestavljajo naselja Črni vrh, Miklavž pri Taboru in Loke. Gre večinoma za razložena naselja, veliko pa je tudi samotnih kmetij. Hriboviti del občine je naravno izjemno pester, s travnikov in jas pa se odpirajo čudoviti razgledi proti Savinjski dolini in naprej proti Kamniškim Alpam. Področje je vedno bolj zanimivo za izgradnjo strnjenih stanovanjskih naselij in vikendov, turistično pa se intenzivno razvija. V zgodovinskih listinah je Tabor prvič omenjen že leta 1436. Je središčno naselje občine in farno središče Župnije Sv. Jurij ob Taboru. Ima obliko

razloženega naselja z gručastim jedrom in leži na terasi med potokoma Konjščica in Kučnica. Mimo Tabora je peljala že rimska cesta Emona - Celeia, vendar je kraj v pisnih virih omenjen šele v srednjem veku. Prvotno ime Tabora je bilo Sv. Jurij ob Taboru, ljudsko Šentjur, današnje ime pa je kraj dobil po tabornem obzidju okoli cerkve sv. Jurija, ki je bilo postavljeno ob koncu 15. stoletja, kot obramba pred Turki. Naselje Tabor leži na prehodu iz nižinskega v hriboviti del občine, med rodovitnimi polji in travniki, ki so že od nekdaj predstavljala zdravo osnovo vaške ekonomije. S svojo lego pod obronki hribov predstavlja izhodišče za zanimive planinske in kolesarske izlete. Prebivalci se preživljajo v manjši meri s kmetijstvom, sicer pa so večinoma zaposleni v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.



Slika št. 11: Občina Tabor iz zraka

Naselje Tabor, ki predstavlja urbani del občine in ima prometno ugodno lego, to je blizu magistralne ceste Celje – Ljubljana, in blizu avtocestne povezave Ljubljana-Maribor, je v zadnjem desetletju z množično izgradnjo in obnovo stanovanjskih hiš zelo spremenilo svojo zunanjo podobo. Predmetna investicija se bo nahajala na robu naselja Tabor.

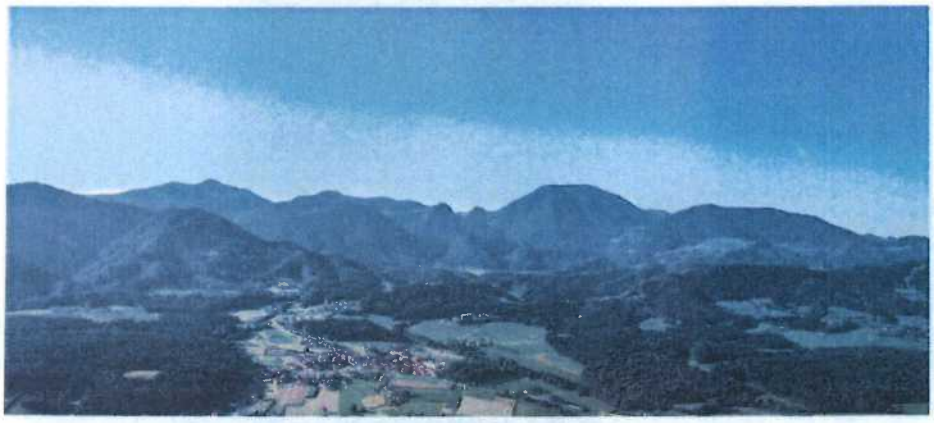


Slika št. 12: Zračni posnetek naselja Tabor z okolico

Planirana investicija bo izvedena na parcelnih številkah št. 1059/2, 1058/2, 1060/4, 1057/2, 1055/2, 1657/2, 1056/7, 1055/3, 1533/26, 1533/23, 1533/3, vse k.o. Ojstriška vas.

2.4. SPLOŠNI PODATKI O UPORABNIKIH

Občina Tabor ima na dan 30.04.2026 1.886 prebivalcev različnih starostnih skupin. V zadnjih letih smo priča živahnemu trendu porasta števila prebivalstva v občini. Delno je to zaradi povečanega števila rojstev v zadnjih letih, predvsem pa zaradi priselitve mladih družin, kot posledice intenzivnih novogradenj strnjenih naselij, predvsem v nižinskem, urbanem delu občine.

Rast prebivalstva, s prebivalstvom povezane potrebe po izboljšanju kvalitete življenja in izgradnja nove infrastrukture v ta namen, ima za posledico, da se meja med urbanim in neurbanim delom občine vedno bolj pomika proti hribovitim predelom občine.



Slika št. 13: Rast prebivalstva

Če starejše opredelitve pojma podeželje izpostavljajo bolj ali manj lastnosti, kot so prevlada primarnih gospodarskih dejavnosti, razpršena poselitev, nižja gostota prebivalstva, ter navezanost ljudi na zemljo, pa danes vemo, da te značilnosti niso več tako izrazito povezane z omenjenim pojmom. V sodobnem času postaja podeželje prostor naseljevanja prebivalstva, razvijanja industrijskih, turističnih in drugih terciarnih dejavnosti ter območje spreminjanja družbenih vrednot in kulturne identitete. Spremenil se je videz in tip hiš, opazne so številne dozidave in razpršena pozidava, spremenila se je namembnost objektov in zemljišč (ni več gospodarskih poslopij - hlevov, kurnikov, shramb - danes so iz njih nastale delavnice, garaže, skladišča; na mestu nekdanjih njiv pa so danes asfaltirana parkirišča, vrtovi in gredice z rožami, površine s travo, bazeni ipd). Spremenila se je dejavnost prebivalstva. Nekoč so prevladovali kmetje, danes so ljudje zaposleni večinoma v nekmetijskih dejavnostih. Pojavljajo se številna spalne vasi, povečujejo se dnevne migracije.

Spodnja tabela prikazuje živahen trend rasti prebivalstva v zadnjih letih.

Leto	2011	2014	2017	2020	2023	2024	2025	30.04. 2026
Število prebivalcev	1626	1720	1743	1741	1813	1851	1858	1886
Število moških	810	862	878	874	911	935	940	959
Število žensk	816	858	865	867	902	916	918	927
Površina občine (km²)	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Gostota prebivalstva (preb/km²)	**47**	**49**	**50**	**50**	**52**	**53**	**53**	**54**

Tabela št. 1: Število prebivalcev v Občini Tabor po letih na dan 31.12., za leto 2026 na dan 30.04.
(Vir: MNZ)

Občina Tabor in Občina Vransko sta z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor (Ur.l. RS, št. 43/2000) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Ur.l.RS, št.113/00, 69/01, 72/02, 2/04, 102/08, 69/10, 82/10, Ur.o. OT, št. 11/24), ustanovili JVIZ OŠ Vransko-Tabor, ki se sestoji iz štirih organizacijskih enot: POŠ Tabor, Vrtec Tabor, matična OŠ Vransko in Vrtec Vransko.

Razred	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	20	19	22	18	22	21	20	21	23	23	22
2.	14	19	20	22	17	21	22	21	21	20	23
3.	22	15	18	20	22	17	22	24	23	22	20
4.	12	23	15	19	19	22	17	21	23	23	22
5.	14	11	23	16	19	19	25	18	22	22	23
6.	8	14	11	25	16	19	19	25	19	19	23
7.	13	8	13	10	25	17	19	20	24	23	19
8.	10	13	9	14	10	26	19	20	22	22	23
9.	22	11	13	8	14	11	26	18	19	19	22
Skupaj:	135	133	144	152	164	173	189	188	196	193	197

Tabela št. 2: Število učencev v POŠ Tabor na dan 31.12. po letih, za leto 2026 na dan 11.05.
(Vir: JVIZ OŠ Vransko-Tabor)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
98	101	101	94	87	104	105	128	133	144	134

Tabela št. 3: Število otrok v Vrtcu Tabor na dan 31.12. po letih, za leto 2026 na dan 11.05
(Vir: JVIZ OŠ Vransko-Tabor)

2.5. RAZLOGI IN UTEMELJITEV INVESTICIJSKE NAMERE

Predvidena investicija zajema ureditev dostopne poti do območja t. i. Račnika, ki predstavlja pomemben lokalni naravni habitat z visoko naravovarstveno vrednostjo. Na območju se nahaja potok, ki se steka v Račnik, z življenjskim prostorom brezzobke - potočnega škržka ter gnezdišči divjih rac ter naravni prehod za žabe, zato je območje pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravne dediščine lokalnega okolja.

Namen investicije je izboljšati dostopnost območja na trajnosten in naravi prijazen način ter hkrati zagotoviti ustrezno zaščito občutljivih habitatov. Ureditev poti bo omogočila varnejši in nadzorovan obisk območja, zmanjšala nenadzorovane posege v naravo ter prispevala k dolgoročnemu ohranjanju ekosistema ribnika in njegove okolice.

Pomemben del investicije predstavlja tudi postavitev informacijskih tabel o školjki brezzobki, žabah in divjih racah, s katerimi se bo obiskovalce ozaveščalo o pomenu varovanja narave, lokalnih živalskih vrst in njihovih habitatov. Investicija vključuje tudi izvedbo naravovarstvenih delavnic za odrasle in šolarje, kar bo prispevalo k večji okoljski ozaveščenosti prebivalcev, spodbujanju trajnostnega odnosa do narave ter prenosu znanja na mlajše generacije.

Takšna ureditev predstavlja primer dobre prakse povezovanja varstva narave, izobraževanja in trajnostnega razvoja lokalnega okolja.

Investicija je v javnem interesu, saj prispeva k:

- ohranjanju naravne dediščine in biotske raznovrstnosti,
- izboljšanju kakovosti življenjskega okolja prebivalcev,
- razvoju okoljske vzgoje in izobraževanja,
- spodbujanju trajnostnega turizma in rekreacije,
- večji ozaveščenosti javnosti o pomenu varovanja narave,
- ustvarjanju urejenega in varnega prostora za obiskovalce ter lokalno skupnost.

Projekt ima dolgoročne pozitivne učinke na naravno okolje, lokalno skupnost in izobraževanje ter predstavlja trajnostno naravnano investicijo, ki prispeva k varovanju in promociji naravnih vrednot občine.



Slika št. 14: Brezzobka



Slika št. 15: Raca mlakarica



Slika št. 16: Navadna krastača



Slika št. 17: Primer informacijske table

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1. CILJI INVESTICIJE

Glavni cilj investicije je ureditev dostopne in varne poti do območja t. i. Račnika, ki predstavlja pomembno naravno vrednoto lokalnega okolja zaradi prisotnosti zaščitenih in naravovarstveno pomembnih živalskih vrst. Investicija je usmerjena v ohranjanje biotske raznovrstnosti, izboljšanje dostopnosti območja za obiskovalce ter povečanje ozaveščenosti javnosti o pomenu varstva narave.

Na območju Račnika se nahaja habitat školjke brezzobke iz družine potočnih škržkov, prehod za žabe ter gnezdišča divjih rac, zato projekt vključuje ukrepe za izboljšanje pogojev za ohranjanje naravnega okolja in zmanjšanje negativnih vplivov na habitatne razmere.

Specifični cilji investicije

- ureditev poti do območja Račnika z namenom izboljšanja dostopnosti in varnosti obiskovalcev;
- ohranjanje in zaščita habitatov brezzobke, žab ter gnezdišč divjih rac;
- postavitev informacijskih tabel o naravnih značilnostih območja ter predstavitev živalskih vrst;
- povečanje ozaveščenosti lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu varstva narave in biotske raznovrstnosti;
- izvedba naravovarstvenih delavnic za odrasle, otroke in šolarje;
- izvedba strokovnega predavanja na temo biotske raznovrstnosti in naravovarstva;
- spodbujanje trajnostnega razvoja, sonaravnega turizma in medgeneracijskega izobraževanja.

Z izvedbo investicije bo območje Račnika pridobilo dodatno razvojno vrednost na področju trajnostnega upravljanja naravne dediščine, izobraževanja in razvoja lokalne turistične ponudbe. Projekt bo omogočil razvoj novih vsebin za okoljsko ozaveščanje, vključevanje lokalne skupnosti ter izvajanje izobraževalnih aktivnosti za različne ciljne skupine.

Ureditev območja bo prispevala k večji prepoznavnosti občine na področju ohranjanja narave in trajnostnega razvoja ter ustvarila pogoje za nadaljnje projekte s področja naravovarstva, izobraževanja in trajnostnega turizma.

3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI

Strokovna izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) so krovni strateški dokumenti države - Državni razvojni program, Strategije razvoja Slovenije 2030 (SRS) ter Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Navedena dokumenta opredeljujeta izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo gospodarskega in prostorskega razvoja države.

Predvidena investicija je usklajena z nacionalnimi razvojnimi dokumenti Republike Slovenije ter podpira cilje trajnostnega razvoja, varstva narave, izboljšanja kakovosti bivanja in razvoja okoljske ozaveščenosti.

Usklajenost z Državnim razvojnim programom

Investicija sledi usmeritvam Državnega razvojnega programa, predvsem na področju trajnostnega upravljanja naravnih virov, izboljšanja kakovosti življenjskega okolja ter razvoja lokalne infrastrukture z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Projekt prispeva k ohranjanju naravne dediščine, povečanju dostopnosti naravnih območij in spodbujanju vključevanja lokalnega prebivalstva v aktivnosti varstva okolja.

Z izvedbo investicije se spodbuja tudi razvoj izobraževalnih in ozaveščevalnih vsebin, ki prispevajo k večji družbeni odgovornosti in dolgoročnemu trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri.

Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030)

Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, zlasti na področjih:

- ohranjanja zdravega naravnega okolja;
- trajnostnega upravljanja naravnih virov;
- krepitve kakovosti življenja lokalnega prebivalstva;
- razvoja trajnostnega turizma in zelene infrastrukture;
- spodbujanja vseživljenjskega učenja in okoljske ozaveščenosti.

Investicija prispeva k strateškemu cilju ustvarjanja kakovostnega življenjskega prostora ter krepitve naravne identitete lokalnega okolja. Z izvedbo naravovarstvenih delavnic, informacijskih vsebin in ureditve inovativnega ptičjega habitata se spodbuja razumevanje pomena biotske raznovrstnosti in varstva narave med različnimi generacijami prebivalcev.

Usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Investicija je skladna tudi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj spodbuja trajnostno urejanje prostora, ohranjanje naravnih kakovosti ter uravnotežen razvoj območij z visoko naravovarstveno vrednostjo.

Projekt podpira načela sonaravnega razvoja prostora z ureditvijo dostopa do območja Račnika na način, ki ne posega prekomerno v občutljivo naravno okolje, temveč prispeva k njegovi zaščiti in interpretaciji. Postavitev informacijskih tabel ter ureditev ptičjega habitata predstavljata ukrepe za izboljšanje doživljajske, izobraževalne in ekološke funkcije prostora.

Investicija tako prispeva k trajnostnemu upravljanju prostora, ohranjanju biotske raznovrstnosti ter izboljšanju kakovosti javnega prostora za prebivalce in obiskovalce občine.

Planirana investicija je bo predmet rebalansa Proračuna Občine Tabor 2026, proračuna 2027 in Načrta razvojnih programov Občine Tabor.

Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam na širšem območju lokalne skupnosti in sicer:

- lokalnemu prebivalstvu vseh starostnih skupin;
- otrokom in šolarjem, ki bodo vključeni v naravovarstvene in izobraževalne aktivnosti;
- vzgojno-izobraževalnim ustanovam za izvajanje učnih in raziskovalnih vsebin v naravi;
- društvom in organizacijam s področja varstva narave, turizma, rekreacije in izobraževanja;
- obiskovalcem in turistom, zainteresiranim za naravno dediščino in trajnostni turizem;
- ljubiteljem narave, opazovalcem ptic in raziskovalcem biotske raznovrstnosti;
- starejšim prebivalcem in družinam, ki jim bo urejena pot omogočala varnejši in kakovostnejši dostop do območja Račnika;
- širši javnosti z namenom povečanja ozaveščenosti o pomenu ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti.

Projekt s svojo vsebino spodbuja medgeneracijsko povezovanje, trajnostno ravnanje z naravnimi viri ter krepitev odnosa lokalne skupnosti do naravne dediščine.



Slika št. 18: Izobraževalne aktivnosti v naravi

Naravovarstvene delavnice za vrtec in osnovno šolo so velikega pomena. V primeru Račnika, kjer so prisotni občutljivi vodni in obvodni ekosistemi, lahko delavnice postanejo neposreden most med otroki in razumevanjem delovanja narave. Pri predšolskih otrocih (vrtec) je poudarek predvsem na doživljanju in čustveni povezanosti z naravo. Otroci skozi opazovanje vode, živali, sledi ali zvokov razvijajo osnovno spoštovanje do živih bitij in empatijo do narave. V osnovni šoli se delavnice nadgradijo v razumevanje. Učenci lahko že spoznavajo osnovne pojme ekosistema, prehranskih verig in pomena biotske raznovrstnosti. Pri potočnem škržku je denimo zelo zanimivo, da gre za pokazatelja čiste vode, kar omogoča razlago o kakovosti vode in vplivu človeka na okolje. Pri racah pa se lahko odpre tema selitev, gnezdenja in pomena mirnih habitatov brez motenj.

Ključna dodana vrednost takšnih delavnic je, da otroci ne ostanejo pri abstraktnih pojmih, ampak vidijo konkreten primer v svoji okolici. To pomeni, da se naravovarstvo ne uči kot "šolska snov", temveč kot nekaj, kar neposredno vpliva na kraj, kjer živijo. Tak pristop dolgoročno krepi odgovorno ravnanje – od neodmetavanja odpadkov do razumevanja, zakaj je pomembno ohranjati mirna območja ob vodi.

Na širši ravni pa takšne delavnice ustvarjajo generacijo, ki naravo ne vidi kot "prostor za uporabo", ampak kot

4. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE

4.1. VARIANTA BREZ INVESTICIJE

Varianta »brez« investicije pomeni, da se obstoječe stanje ohrani. S tem se zastavljeni cilji ne morejo realizirati, zato v težnji po izboljšanju stanja, ta varianta ni sprejemljiva.

V primeru, da se projekt ne izvede, bi občina sicer kratkoročno privarčevala določena proračunska sredstva, vendar bi to imelo več negativnih posledic za lokalno okolje, prebivalce in naravno dediščino območja.

Brez izvedbe investicije bi območje Račnika ostalo infrastrukturno neurejeno in slabše dostopno, kar bi zmanjšalo možnosti za varno obiskovanje območja ter omejilo razvoj izobraževalnih, naravovarstvenih in turističnih vsebin. Prav tako ne bi bili izvedeni ukrepi za izboljšanje pogojev ohranjanja habitata potočnega škržka in gnezdišč divjih rac, kar bi lahko dolgoročno negativno vplivalo na stanje biotske raznovrstnosti na območju.

Neizvedba projekta bi pomenila tudi zamujeno priložnost za povečanje okoljske ozaveščenosti lokalnega prebivalstva, otrok in obiskovalcev. Brez informacijskih tabel, naravovarstvenih delavnic in inovativnega ptičjega habitata bi bilo manj možnosti za izobraževanje in aktivno vključevanje javnosti v varstvo narave ter trajnostno ravnanje z okoljem.

Poleg tega občina ne bi izkoristila razvojnega potenciala območja za trajnostni turizem, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje. Posledično bi bila zmanjšana tudi prepoznavnost občine na področju ohranjanja naravne dediščine in izvajanja trajnostno usmerjenih projektov.

Varianta »brez investicije« zato ne omogoča doseganja zastavljenih razvojnih, okoljskih in družbenih ciljev ter dolgoročno ni primerna rešitev za lokalno skupnost.

4.2. VARIANTA Z INVESTICIJO

Varianta »z« investicijo je v javnem interesu Občine Tabor in je ugodnejša z vidika ohranjanja naravne dediščine, izboljšanja dostopnosti območja ter razvoja izobraževalnih in trajnostnih vsebin za lokalno prebivalstvo in obiskovalce. Projekt bo omogočil večjo ozaveščenost o pomenu biotske raznovrstnosti, varstva habitatov in trajnostnega ravnanja z naravnim okoljem.

Hkrati se bo izboljšala urejenost območja Račnika ter njegova prepoznavnost kot pomembnega naravnega in izobraževalnega prostora lokalne skupnosti. Izvedba investicije bo zasledovala cilje in dosegla javni interes lokalne skupnosti na področju varstva narave, trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja.

4.3. PRIMERJAVA VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Ob primerjavi obeh variant, »brez« in »z« investicijo ugotovimo, da je primernejša varianta »z« investicijo. Poglavitno merilo za izbor optimalne variante je doseganje razvojnih, okoljskih in družbenih ciljev projekta ter dolgoročna korist za lokalno skupnost in širše okolje.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Projekt »Po poti do Račnika in živih voda« je opredeljen kot občinski investicijski projekt in obsega vse aktivnosti za ureditev kvalitetne in varne dostopne poti ter aktivnosti za ohranjanje naravnega habitata ter osveščanja prebivalcev in obiskovalcev o naravovarstvu.

Investicija je opredeljena kot turistično-rekreacijska in učna infrastruktura, ki je v pristojnosti Občine Tabor.

Vrsta investicije: gradbena in montažna dela. Gre tudi za investicijo v znanje uporabnikov.

Investicija ne bo imela neposrednih finančnih učinkov, zato so njeni učinki opredeljeni kot družbeni, okoljski in razvojni učinki:

- izboljšanje dostopnosti do Račnika in njegove okolice za prebivalce in obiskovalce;
- povečanje kakovosti bivanjskega okolja ter možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa;
- ozaveščanje o pomenu varstva narave in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
- krepitev naravovarstvene zavesti med lokalnim prebivalstvom, mladimi in obiskovalci;
- spodbujanje trajnostnega odnosa do naravnega okolja;
- ohranjanje in promocijo naravne dediščine območja;
- izobraževalne in interpretacijske vsebine preko informativnih tabel in drugih oblik predstavitve naravnih vrednot;

5.2. DOLOČITEV POTREBNE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO

V skladu z veljavno zakonodajo mora investitor za navedeni poseg izdelati ustrezno projektno tehnično dokumentacijo in po končani gradnji opraviti pregled in prevzem investicije v uporabo.

Za investicijo je potrebno:

- izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- uvrstiti projekt v NRP Občine Tabor 2025-2028,
- zagotoviti finančna sredstva v Proračunu Občine Tabor v letu 2026,
- pridobiti finančna sredstva LAS SSD, kot posledico uspešnega kandidiranja na javni poziv iz sklada EKSRP in pripraviti razpisno dokumentacijo za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo del in nadzora,
- izvesti postopek izbora najugodnejšega izvajalca,
- izvesti dela v skladu s projektom, prijavo na javni poziv, sklepom LAS SSD in pogodbo MGRT.

5.3. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Investicijska vlaganja obsegajo: gradbena in montažna dela:

Aktivnosti so planirane v letih 2026 in 2027.

Tabela št. 1: Popis del in opreme

Z.št.	Opis postavke	Enota mere	Količina
I.	PREDDELA	KPL	1
II.	ZEMELJSKA DELA	KPL	1
III.	VOZIŠČE IN KONSTRUKCIJE	KPL	1
IV.	ODVODNJAVANJE	KPL	1
V.	OSTALA DELA	KPL	1
VI.	NEPREDVIDENA DELA	KPL	1
VII.	INFORMATIVNE TABLE	KOS	3
VIII.	LESENI STEBRIČKI ZA TABLE	KOS	6
IX.	NADZOR	KPL	1

5.4. DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE

5.4.1. Vrednost investicije po stalnih cenah

Vrednost investicije je izračunana na podlagi pridobljenega projektantskega popisa ter drugih relevantnih podatkov. Stroškov zemljišč ne predvidevamo, vključen je 22 % davek na dodano vrednost. Izvedba investicije je planirana v letih 2026 in 2027, sredstva bodo zagotovljena v rebalansu Proračunu Občine Tabor za leto 2026 in proračunu za leto 2027, projekt bo umeščen v Načrt razvojnih programov občine.

Ocena stroškov celotnega projekta na osnovi popisov in predračunov znaša 105.655,13 EUR brez DDV.

Tabela št. 2: Ocena investicije po stalnih cenah brez DDV

Z.št.	Opis postavke	EUR
I.	PREDDELA	2.524,50
II.	ZEMELJSKA DELA	24.635,80
III.	VOZIŠČE IN KONSTRUKCIJE	57.498,00
IV.	ODVODNJAVANJE	4.300,00
V.	OSTALA DELA	1.510,00
VI.	NEPREDVIDENA DELA	9.046,83
VII.	INFORMATIVNE TABLE	70,00
VIII.	LESENI STEBRIČKI ZA TABLE	70,00
IX.	NADZOR	6.000,00
	SKUPAJ:	**105.655,13**

Tabela št. 3: Neto in bruto vrednost investicije

	EUR
INVESTICIJA brez DDV	105.655,13
DDV	23.244,13
SKUPAJ	**128.899,26**

Tabela št. 4: Financiranje investicije po virih sredstev

FINANCIRANJE	EUR
lastna sredstva (brez DDV):	70.655,13
lastna sredstva (DDV)	23.244,13
Lastna sredstva skupaj	**93.899,26**
EKSRP	35.000,00
SKUPAJ	**128.899,26**

Investitor bo za investicijo zagotovil finančna sredstva v letih 2026 in 2027, v skupni višini 93.899,26 EUR, od tega 66,87 % neto vrednosti, ki znaša 70.655,13 EUR in 22 % DDV, ki znaša 23.244,13 EUR. 33,13 % neto vrednosti projekta v višini 35.000,00 EUR se bo financiralo iz sredstev EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Gre za nepovratna sredstva v okviru podpore za izvajanje projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja.

5.4.2. Vrednost investicije po tekočih cenah

Ocenjujemo, da se vrednost v času izvedbe projekta zaradi vpliva inflacije ne bo spremenila, zato planiramo, da je vrednost v tekočih cenah enaka vrednosti v stalnih cenah.

Ocenjena vrednost investicije znaša 128.899,26 EUR z DDV.

5.5. DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 54/2010 in 27/2016), je za projekte manjše od 300.000 potrebno izdelati samo dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

5.6. POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR

Glede na predviden poseg v prostor za izvedbo investicije ni potrebno gradbeno dovoljenje.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA, IZVEDLJIVOST

Pridobljen je projektantski popis.

6.2. TERMINSKI PLAN

Terminsko je izvedba projekta predvidena v letih 2026 in 2027, ki je tudi zaključno leto izvedbe.

Tabela št. 5: Terminski plan

Aktivnost	2026	2027
Potrditev DIIP	junij	-
Pridobitev zemljišč	avgust	-
Prijava na JP LAS	september	-
Sklep o izboru LAS	november	-
Obvestilo LAS o oddaji vloge na MKGPS	december	-
JR za izbor izvajalcev	-	januar
Začetek del		marec
Podpis pogodbe z MKGPS		Junij
Pregled in prevzem del in opreme		Junij
Predaja v uporabo		julij

6.3. VARSTVO OKOLJA IN VPLIVI NA OKOLJE

Pri izvajanju projekta bodo upoštevani vsi predpisi in zakonski standardi, ki zagotavljajo varstvo okolja. Ne pričakuje se poseben vpliv na okolje.

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva:

- na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici,
- na varnost pred požarom,
- na emisije strupenih plinov, nevarnih delcev, sevanj, onesnaženja ali zastrupitve tal,
- na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici zunaj parcel, na katerih bodo potekale aktivnosti in
- na prekomeren hrup.

Projekt je skladen z občinski prostorskimi akti:

- Občinski prostorski načrt občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 2/2016).

6.4. KADRI IN ORGANIZACIJA

Vodja projekta, ki prevzema skrbništvo in odgovornost za vodenje in izvedbo projekta, je Saša Zidanšek Obreza, univ.dipl.ekon., Višja svetovalka I, pri izvedbi pa bodo sodelovale vse strokovne službe občine in zunanji izvajalci.

Odgovorni vodja projekta je zadolžen za naslednje aktivnosti:

- pripravo projekta,
- pripravo investicijske in projektne dokumentacije,

- izvedbo projekta.

Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu v katerem sodelujejo tudi drugi zaposoleni Občine Tabor. Skupina za izvedbo operacije se bo v času njenega izvajanja prilagajala vsebini in značaju aktivnosti.

Ob zaključku tehnične izvedbe operacije se pristopi k tehničnem pregledu (skladnost izvedbe operacije s projektno dokumentacijo ter s predpisi) ter h kvalitativnemu prevzemu operacije. S kvalitativnim prevzemom operacije bo opravljen pregled kvalitete opravljenih del. Kvalitativni prevzem se opravi zapisniško, v zapisnik pa se vnesejo tudi vse ugotovljene pomanjkljivosti in roki za njihovo odpravo. Po zaključku celotnega projekta se izdela končno poročilo. Končno poročilo se posreduje pristojnemu organu investitorja.

Nadzor nad izvajanjem projektnih aktivnosti (roki, porabljena sredstva) izvajata skrbnik projekta in zunanji izvajalec (kvaliteta), ki po potrebi takoj obvestita odgovorno osebo investitorja o odstopanjih in o potrebnih ukrepih za izvedbo operacije.

6.5. FINANCIRANJE PROJEKTA

Investicija se financira iz sredstev proračuna investitorja Občine Tabor ter iz sredstev pridobljenih na Javnem pozivu za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2021-2027 iz sklada EKSRP.

Občina Tabor bo neto vrednost projekta sofinancirala v višini 66,87 % , to je 70.655,13 EUR.

Preostalo neto vrednost projekta v višini 33,13 % bo sofinanciranih s strani EKSRP oz. LAS SSD, v skupni višini 35.000,00 EUR.

Občina Tabor bo financirala tudi celoten DDV to je 22.941,57 EUR.

Investicija bo dokončana v mesecu juliju 2027.

Tabela št. 6: Viri financiranja neto vrednosti investicije

Viri financiranja	Skupaj
Lastna sredstva 66,87 % (brez DDV)	70.655,13
EKSRP 33,13 %	35.000,00
Skupaj	**105.655,13**

6.6. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZ. EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA

Investicija je projekt, ki nima ustreznih meril za ocenjevanje tovrstnih investicij. Koristi, ki jih dosegamo s projektom ocenjujemo v nedenarni obliki, saj je korist iz projekta težko ovrednotiti v denarju. V celoti gre za javno investicijo.

Investicija se obravnava kot družbeno učinkovita, ker prispeva k razvoju lokalne infrastrukture. Predvidoma bo to investicijo uporabljalo na letni ravni več tisoč lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.

Ekonomski kazalniki kažejo na pozitivni vpliv izvedbe na širše družbeno okolje. Družbene koristi izvedbe projekta so tako večje kot so stroški zanj, zato je investicija ekonomsko upravičena. Cilj investicije je izboljšati kakovost življenja v lokalni skupnosti.

Ekonomska upravičenost investicije:

Kvantitativne analize ni mogoče narediti, saj gre za investicijo, ki je širšega družbenega pomena. Koristi investicije se lahko pričakujejo predvsem v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Kljub temu, pa jih lahko strnemo v naslednje točke:

- povečanje urejenih površin notranjih prostorov za prireditve in medgeneracijsko druženje,
- večje možnosti medgeneracijskega sodelovanja,
- dodatne možnosti za vzgojno izobraževalne, kulturne, družabne in športne dejavnosti.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je za predmetno investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije.

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

1. za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
   a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
   b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
   c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi

Celotna ocenjena vrednost predmetnega projekta po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost ne presega 300.000,00 EUR. Iz tega razloga in v skladu s 4. c točko 11. člena Uredbe je za omenjeni projekt potrebno:

- izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- potrditi DIIP in vključiti projekt v Proračun in Načrt razvojnih programov Občine Tabor,
- pričeti z izvajanjem projekta (začetek postopka za izbor izvajalca).

8. PRILOGE

- Popis del

VIRI FOTOGRAFIJ:

- Arhiv Občine Tabor
- Svetovni splet
